

附件 5 环保取土钻孔柱状图




钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目								
工程编号		2020-0241YT			钻孔编号		QT/S-1			
孔口高程(m)		7.98	坐标 (°)	纬度37.240423049		开工日期		2021.4.25	稳定水位深度(m)	2.59
孔口直径(mm)		75		经度116.795809899		竣工日期		2021.4.25	稳定水位日期	2021.4.27
时代成因	地层编号	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	取样 底深度 (m)	地层描述		井体结构图		
Q ₄ ^{al}	1-1	0.80	0.80		0.50	杂填土:褐黄色,土质不均,见建筑垃圾、腐殖质,干,夹黏性土。		<p>膨润土止水</p> <p>封闭管</p> <p>2.00</p> <p>2.50</p> <p>石英砂滤料</p> <p>滤水管</p> <p>8.00</p> <p>沉淀管</p> <p>9.00</p>		
	2-1	2.40	1.60		1.50	粉质黏土:褐黄色,硬塑状,潮湿,均匀,含铁质。				
	2-2	6.00	3.60		2.50	粉土:黄褐色,潮湿,稍密状,均匀。				
					4.00					
	2-3	9.00	3.00		6.00	粉砂:黄褐色,饱和,中密,均匀。				
绘图: 刘浩		审核: 刘浩		项目负责人: 李永辉		日期: 2021.4				

钻孔柱状图








第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目									
工程编号		2020-0241YT			钻孔编号		QT-2				
孔口高程 (m)		7.60	坐标 (°)	纬度37.240369405		开工日期		2021.4.25	稳定水位深度 (m)		
孔口直径 (mm)		63		经度116.796096896		竣工日期		2021.4.25	稳定水位日期		
时代成因	地层编号	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1: 50	取样底深度 (m)	地层描述					附注
Q ₄ ^{al}	1-1	1.00	1.00		0.50	素填土: 棕褐色, 以黏性土为主, 潮湿, 夹少量生活垃圾, 可塑状。					
	2-1	3.00	2.00		1.50	粉质黏土: 褐色, 可塑, 土质均匀, 含铁质, 潮湿。					
					2.50						
	Q ₄ ^{al}	2-3	6.00	3.00		4.00	粉砂: 黄褐色, 饱和, 中密状, 均匀, 含石英。				
				6.00							

绘图: 刘浩 审核: 李伟 项目负责人: 李伟 日期: 2021.4

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目					
工程编号		2020-0241YT		钻孔编号	QT-3		
孔口高程 (m)	7.82	坐标 (°)	纬度 37.240286257	开工日期	2021.4.25	稳定水位深度 (m)	
孔口直径 (mm)	63		经度 116.796636020	竣工日期	2021.4.25	稳定水位日期	
时代成因	地层编号	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:50	取样底深度 (m)	地层描述	附注
Q ₄ ^{al}	1-1				0.50	素填土: 以褐色黏性土为主, 土质不均, 可塑状, 干~潮湿。	
		2.80	2.80		2.00		
Q ₄ ^{al}	2-1	3.00	0.20		3.00	粉质黏土: 褐色, 可塑状, 均匀, 含铁质。	
	2-4				4.00	粉砂: 褐色, 饱和, 中密状, 均匀, 含石英。	
		5.30	2.30				
	2-3-3				6.00	粉土: 褐色, 湿, 中密, 均匀。	
		9.00	3.70				

绘图: 刘浩


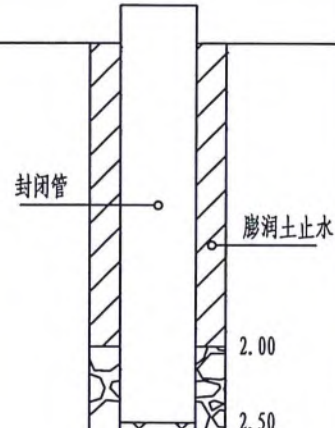

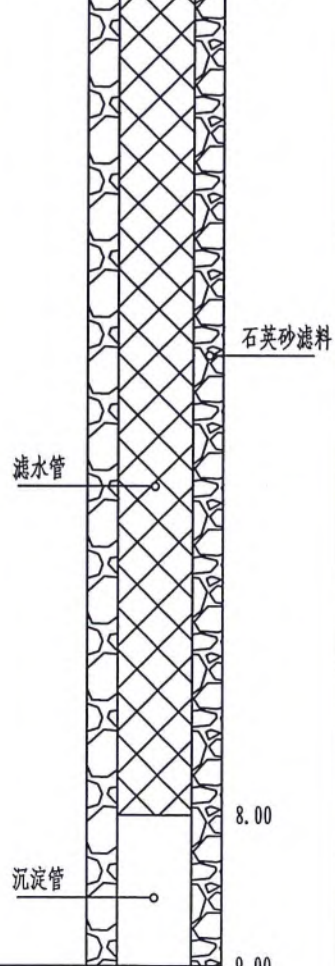




审核:

项目负责人:

日期: 2021.4

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目							
工程编号		2020-0241YT			钻孔编号		QT/S-4		
孔口高程(m)		7.92	坐标 (°)	纬度37.240227248		开工日期	2021.4.25	稳定水位深度(m)	3.57
孔口直径(mm)		75		经度116.797145639		竣工日期	2021.4.25	稳定水位日期	2021.4.27
时代成因	地层编号	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	取样 底深度 (m)	地层描述		井体结构图	
Q ₄ ^{al}	1-1				0.50	素填土:褐色,可塑,潮湿,含铁质,土质不均。			
		3.40	3.40		2.50				
Q ₄ ^{al}	2-1	3.90	0.50		3.90	粉质黏土:褐色,可塑,均匀,含铁质。			
	2-2-4	4.90	1.00		4.50	粉砂:黄褐色,饱和,中密,均匀。			
	2-2	6.60	1.70		6.00	粉土:黄褐色,湿,中密,均匀。			
	2-3					粉砂:黄褐色,饱和,中密,均匀,含石英。			
		9.00	2.40						
									
绘图: 刘浩 审核: 王德军 项目负责人: 徐明海 日期: 2021.4									

绘图: 刘浩





审核: 刘浩

项目负责人: 刘浩

日期: 2021.4

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目							
工程编号		2020-0241YT		钻孔编号		QT-5			
孔口高程 (m)		5.64	坐标 (°)	纬度 37.239999260		开工日期	2021.4.25	稳定水位深度 (m)	
孔口直径 (mm)		63		经度 116.795632874		竣工日期	2021.4.25	稳定水位日期	
时代成因	地层编号	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:50	取样底深度 (m)	地层描述		附注	
Q ₄ ^{al}	1-1	0.30	0.30		0.30	素填土: 以褐色黏性土为主, 土质均匀, 软塑状。			
	2-1	1.50	1.20		1.50	淤泥质黏土: 灰黑色, 流塑, 均匀, 含有机质。			
						粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 均匀。			
						粉砂: 褐黄色, 饱和, 中密, 均匀, 含石英。			
	2-2	4.50	3.00		4.10				
2-3	6.00	1.50		6.00					

绘图: 刘浩

审核:

刘健


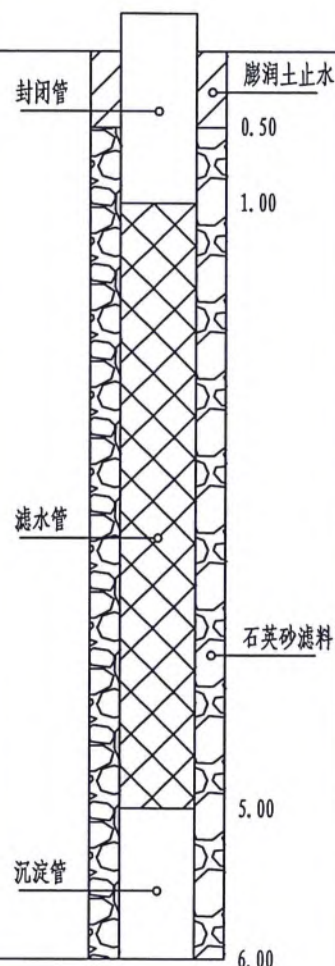



项目负责人:

李新

日期: 2021.4

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目						
工程编号		2020-0241YT			钻孔编号		QT/S-6	
孔口高程(m)		5.97	坐标 (°)	纬度37.239806040	开工日期	2021.4.25	稳定水位深度(m)	0.62
孔口直径(mm)		75		经度116.795926273	竣工日期	2021.4.25	稳定水位日期	2021.4.27
时代成因	地层编号	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	取样 底深度 (m)	地层描述	井体结构图	
Q ₄ ^{al}	1-1	0.20	0.20		0.50	素填土: 以褐色黏性土为主, 软塑, 土质不均, 潮湿。 粉质黏土: 褐色, 可塑, 均匀, 含铁质。		
	2-1	1.90	1.70		1.50			
	2-2-4	4.50	2.60		2.40	粉砂: 黄褐色, 饱和, 中密, 均匀, 含石英。		
	2-3-3	6.00	1.50		4.00	粉土: 褐色, 湿, 中密, 均匀。		
					6.00			

绘图: 刘浩

审核: 刘浩

项目负责人: 刘浩

日期: 2021.4

绘图: 刘浩








审核: 刘连成

项目负责人: 徐明远

日期: 2021.4

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目									
工程编号		2020-0241YT			钻孔编号		QT-7				
孔口高程(m)		8.20	坐标 (°)	纬度37.239956244		开工日期		2021.4.25	稳定水位深度(m)		
孔口直径(mm)		63		经度116.796516359		竣工日期		2021.4.25	稳定水位日期		
时代成因	地层编号	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	取样 底深度 (m)	地层描述					附注
Q ₄ ^{al}	1-1				0.50	素填土:褐灰色,软塑,土质不均,含有机质、铁质。					
		2.40	2.40		2.00						
Q ₄ ^{al}	2-1				3.00	粉质黏土:褐黄色,可塑,均匀,含铁质。					
		3.50	1.10								
	2-2				4.00	粉土:褐黄色,湿,中密,均匀。					
		6.00	2.50		6.00						
Q ₄ ^{al}	2-3				7.50	粉砂:褐色,饱和,中密,均匀,含石英。					
		9.00	3.00								

绘图: 刘浩

审核: 李德成

项目负责人: 李德成

日期: 2021.4

绘图: 刘浩


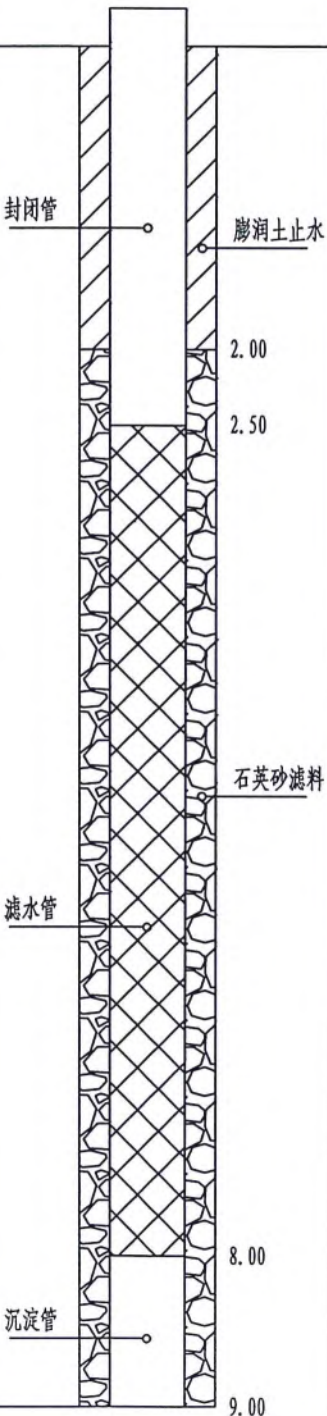




审核: 李健

项目负责人: 李健

日期: 2021.4

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		临邑县临盘垃圾场维修完善整改项目					
工程编号		2020-0241YT		钻孔编号		QT/S-8	
孔口高程(m)		9.60	坐标 (°)	纬度37.239773854	开工日期	2021.4.25	稳定水位深度(m) 4.34
孔口直径(mm)		75		经度116.797084987	竣工日期	2021.4.25	稳定水位日期 2021.4.27
时代成因	地层编号	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:50	取样底深度(m)	地层描述	井体结构图
Q ₄ ^{al}	1-1	2.20	2.20		0.50 2.20	素填土:褐色,硬塑,均匀,含铁质,以黏性土为主。	 <p>封闭管</p> <p>膨润土止水</p> <p>2.00</p> <p>2.50</p> <p>石英砂滤料</p> <p>滤水管</p> <p>沉淀管</p> <p>8.00</p> <p>9.00</p>
	2-1-1	3.90	1.70		3.00	黏土:褐色,硬塑,均匀,含铁质。	
	2-1	5.30	1.40		5.00	粉质黏土:褐色,硬塑,均匀。	
	2-2	6.00	0.70			粉土:褐色,湿,中密状,均匀。	
	2-3	9.00	3.00		7.00	粉砂:褐色,饱和,中密,均匀,含石英。	

绘图: 刘浩

审核:

项目负责人:

日期: 2021.4
